

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Покупатель**  
XXX

Директор по капитальному строительству

\_\_\_\_\_ /XXX/

**СОГЛАСОВАНО:**

**Поставщик**  
ООО «Андромета»  
Технический директор

\_\_\_\_\_ /А.Б. Акопян/



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4080/15Т от 31.08.2015 г.**

1. **ЗАПРОС** (наименование объекта): два одинаковых комплекта зданий на объект:  
ЦСП. Строительство склада по приемке и хранению привозных штампов (120 тыс. т/год).

2. **ПОКУПАТЕЛЬ:** ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

3. **НАЗНАЧЕНИЕ ЗДАНИЯ:** склад

4. **РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА:** Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи.

5. **ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ:**

5.1. **Размеры здания (ширина и длина здания указаны по наружным граням колонн и стоек):**

24 x 60 x 8,4 (h) м  
(ширина) (длина) (высота до низа несущих конструкций)

5.2. **Пролеты:** 24 м

5.3. **Шаг колонн:** 6 м

5.4. **Каркас:**

Колонны – сварные двутавровые профили из стальных листов (марка стали С255 по ГОСТ 27772-88) постоянного по длине сечения, покрытие – грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (цвет красно-коричневый, 40 мкм).

Фермы, прогоны кровли, прогоны стен, связи вертикальные и горизонтальные - из холодногнутых стальных оцинкованных профилей. Для оцинкованных элементов каркаса здания принята сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004.

По осям «1» и «11» - рядовая рама.

5.4.1. **Этажность:** 1-этажное

5.5. **Кровля:**

Здание холодного исполнения.

Профлист АК-44-900-0,6-А. Цвет – бело-серый, RAL 9002.

5.5.1. **Скатность:** двухскатная (уклон кровли 25 %)

5.5.2. **Водосток:** наружный неорганизованный

5.6. **Стены:**

Здание холодного исполнения.

Обшиваются торцы по осям «1» и «11» начиная с отметки +7,400 м, продольные стены по осям «А» и «Б».

Покупатель \_\_\_\_\_

Поставщик \_\_\_\_\_

Профлист АС-18.1-1100-0,5-А. Цвет – синий ультрамарин, RAL 5002.

**5.6.1. Отметка цоколя:** по оси «А» и по оси «Б» отметка цоколя +0.500 м, по оси «1» и по оси «11» отметка цоколя 0,000 м.

**5.7. Двери:** нет

**5.8. Окна:** нет

**5.9. Ворота:** нет

**6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ:**

**6.1. Нагрузки от технологического оборудования на кровлю:** НЕТ

**6.2. Нагрузки от технологического оборудования на стены:** НЕТ

**6.3. Особые условия:** НЕТ

**7. НАГРУЗКИ:**

**7.1. Снеговая расчетная нагрузка:** 240 кг/кв. м.

**7.2. Ветровая:** нормативное значение: 23 кг/кв. м.

**7.3. Расчетная температура наружного воздуха:** « – 27° С».

**7.4. Климатический район строительства:** II<sub>5</sub>.

**7.5. Сейсмичность:** до 6 баллов

**8. УПАКОВКА:** Стандартная

**9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:**

**9.1.** В случае разночтения между исходной технической документацией и данным Техническим заданием, конструктивные решения принимать согласно данному Техническому заданию.

**10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ:**

*Приложение к настоящему Техническому заданию – эскиз здания в количестве 1 листа.*

\_\_\_\_\_  
XXX  
Директор по капитальному строительству

\_\_\_\_\_/XXX/

ООО «Андромета»  
И. О. Начальника отдела проектирования




/Г.В. Архипов/



Исполнитель: Менеджер Леонова Екатерина



Приложение к ТЗ 4080/15 от 31.08.2015 г.  
Эскиз здания.

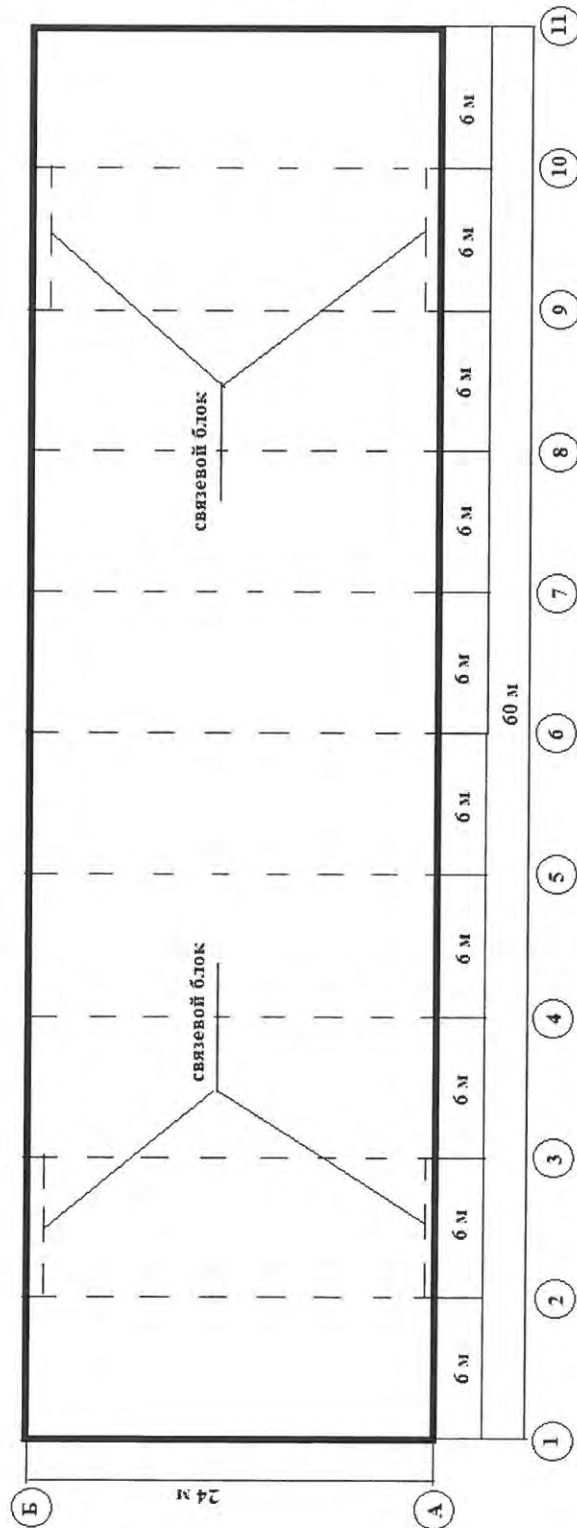

XXX  
Директор по капитальному строительству

\_\_\_\_\_/XXX/

Покупатель \_\_\_\_\_

ООО «Андромета»  
И. О. Начальника отдела проектирования



\_\_\_\_\_/Г.В. Архипов /

Поставщик \_\_\_\_\_
